



Under contract CINEA/2022/OP/0011 with the European Commission
supporting the LIFE Programme




LIFE Nature Deutschland – *Lessons learned, Herausforderungen und Chancen*

Vernetzungstreffen der deutschen LIFE-Nat Projekte
Hannover, 15.-16. Oktober 2024

Claudia PFIRRMANN & Jan SLIVA – ELMEN EEIG, Externes LIFE Monitoring Team

Wer ist wer in LIFE?

Das LIFE-Ökosystem

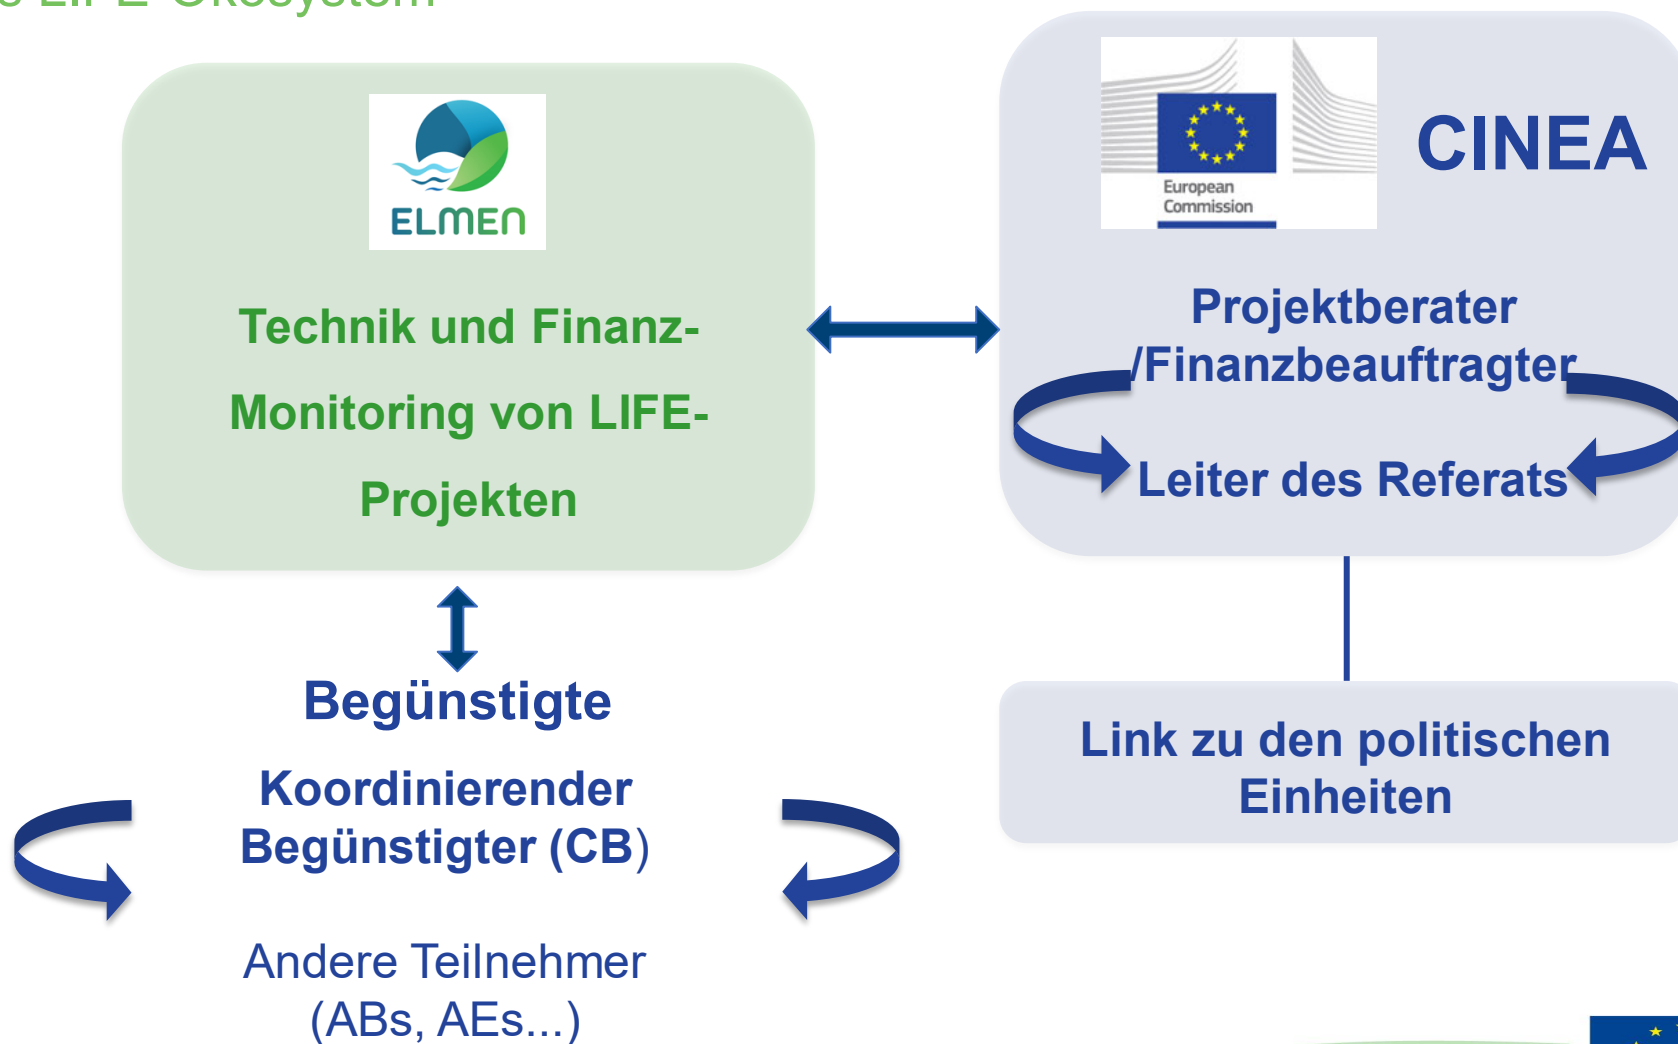


Supported by



Mehr über ELMEN

Das externe Monitoring Team zur Unterstützung der Europäischen Kommission

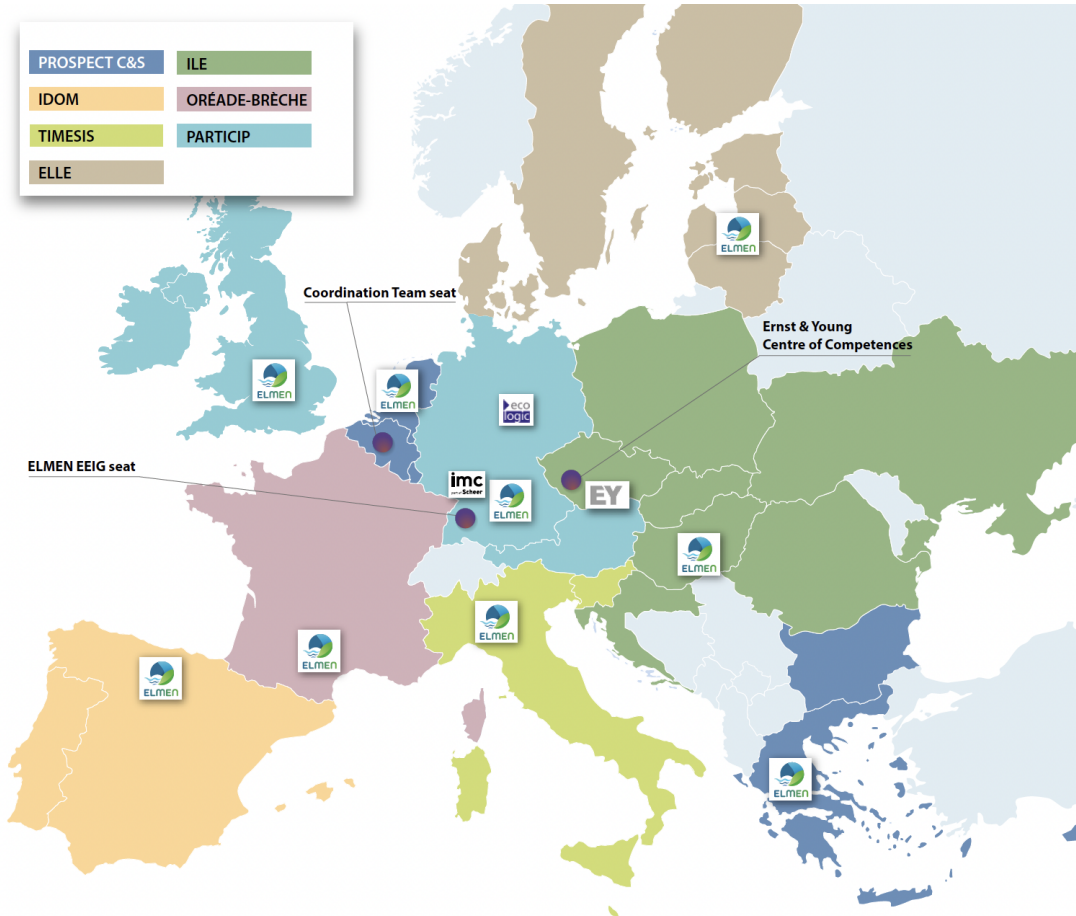

- Konsortium aus **9** Partnern, die CINEA extern unterstützen
- ~ **150 LIFE-Monitoring Experten**
- Koordinierungsteam in Brüssel
- **Particip GmbH** in Deutschland
- Kommunikationsteam in Brüssel
- Team für **Finanzkontrolle** (Prag)



Mehr über ELMEN

Warum? Wann? Was? Wie?

- **Unterstützung des CINEA** bei der Überwachung der Projekte (Erkennung von Risiken und Schwierigkeiten),
- **Unterstützung und Beratung der Begünstigten** in **technischen, administrativen und finanziellen** Fragen,
- **Bewertung des Projektfortschritts** (**Besuche** und regelmäßige **Berichte/Outputs/ Hauptergebnisse**),
- **Wir sind weder** an der Verwaltung des LIFE-Haushalts noch an der LIFE-Berichterstattung **beteiligt**,
- **Nicht befugt**, Entscheidungen im Namen der Agentur zu treffen (**Artikel 25.1.2!**)
- An eine Vertraulichkeits- und Unabhängigkeitserklärung gebunden;
- **Uns** informieren, sobald Probleme auftreten via [LIFE Monitoring Helpdesk](#)



Das LIFE-Programm *aktuell*

- Das LIFE-Programm ist das einzige EU-Förderprogramm, das sich ausschließlich mit Umwelt-, Naturschutz- und Klimaschutzmaßnahmen befasst.
- Das LIFE-Programm trägt in vollem Umfang zu den Zielen und Vorgaben des Europäischen Green Deal bei.
- LIFE hat in den letzten 32 Jahren über 6.000 Projekte finanziert
- Für die Jahre 2021-2027 verfügt LIFE über ein Budget von 5,43 Milliarden €.
- **Budget für Aufrufe 2024 : 571 Millionen €**



Das LIFE-Programm 2021-2027

Unterstützung des Übergangs zu einer kreislaforientierten, auf erneuerbaren Energien basierenden und klimaresistenten Wirtschaft

Verbesserung der Qualität der Umwelt, Minderung des Klimawandels

Aufhalten den Verlust der biologischen Vielfalt



Natur und biologische Vielfalt



Kreislaufwirtschaft und Lebensqualität



Klimawandel Abschwächung und Anpassung



Übergang zu sauberer Energie

Projekte

- Entwicklung und Demonstration innovativer Techniken und Ansätze zur Lösung von Umweltproblemen
- Unterstützung bei der Umsetzung von Plänen und Strategien der EU
- Förderung bewährter Verfahren und Verhaltensänderungen
- Katalysator für die groß angelegte Einführung erfolgreicher Lösungen

Auswirkungen

- Unterstützung der Entwicklung, Überwachung und Umsetzung der EU-Umwelt- und Klimapolitik
- Bereitstellung von Modellen zum Kopieren und Hochskalieren

Die Begünstigten des Projekts sind:

- 1/3 private Unternehmen
- 1/3 NROs und Organisationen der Zivilgesellschaft
- 1/3 öffentliche Stellen



European Commission

Teilprogramm Natur und biologische Vielfalt



Natur und
biologische
Vielfalt

Beitrag zu:

- Eindämmung und Umkehrung des Verlusts der biologischen Vielfalt.
- Unterstützung des Natura-2000-Netzes und der prioritären Aktionsrahmen (PAF)
- Einbeziehung der Ziele in Bezug auf Natur und biologische Vielfalt in andere Politikbereiche und Finanzierungsprogramme.

Typische Aktionen

Projekte zur Förderung des Naturschutzes und der Renaturierung des Natura-2000-Netzes.

Schutz von Arten und Lebensräumen

Invasive gebietsfremde Arten

Wiederherstellung von Ökosystemen und viel mehr ...

Integrierte Umsetzung der PAF oder anderer Pläne im Rahmen der Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt;

Förderung der biologischen Vielfalt

Teilprogramm: Eindämmung des Klimawandels + Anpassung an den Klimawandel (CCA + CCM)



Klimawandel
Abschwächung
und Anpassung

Beitrag zu:

- Die Umwandlung der der Europäischen Union zu einer eine klimaneutrale und -resiliente Gesellschaft, insbesondere durch:
- **Eindämmung des Klimawandels**
- **Anpassung an den Klimawandel und damit verbundene Governance**

Im Bereich des **Klimaschutzes** sind Projekte, die einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung von:

- die Energie- und **Klimapolitik** 2030
- die nationalen Energie- und **Klimapläne** der EU Mitgliedstaaten
- Die langfristige Klima- und Energiestrategie der Europäischen Union

Zur **Anpassung an den Klimawandel**:

- Projekte, die die Umsetzung der neuen EU-Anpassungsstrategie und die damit verbundene nationale Umsetzung unterstützen

Im Rahmen von LIFE 21-27 finanzierte Arten von Projekten (Actions)

Ko-finanzierung

für Projekte / Actions:

- **Standardaktionsprojekte (SAPs)**
- **Strategische Naturprojekte (SNaPs)**
- **Strategische integrierte Projekte (SIPs)**
- **Technische Hilfe (TA-R)**
- **Andere Aktionen (OA)**



Standardaktionsprojekte (SAPs)

LIFE SAPs im Jahr 2024:

- LIFE Natur und biologische Vielfalt
- LIFE Kreislaufwirtschaft und Lebensqualität
- LIFE Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel
- LIFE Clean Energy Transition

Einstufiges Antragsverfahren



Quelle: <https://ied.eu/blog/life-climate-change-mitigation/>






Standardaktionsprojekte (SAPs)

Traditionelle" LIFE-Projekte, die darauf abzielen

- **Entwicklung, Demonstration und Förderung innovativer Techniken, Methoden und Ansätze;**
- einen Beitrag zur Wissensbasis und zur **Anwendung bewährter Verfahren** zu leisten;
- die **Entwicklung, Umsetzung, Überwachung und Durchsetzung der einschlägigen Rechtsvorschriften und Politiken der Union** zu unterstützen, unter anderem durch die Verbesserung der Governance auf allen Ebenen, insbesondere durch den Ausbau der Kapazitäten der öffentlichen und privaten Akteure und die Einbeziehung der Zivilgesellschaft;
- die groß angelegte Einführung erfolgreicher technischer und politischer Lösungen für die Umsetzung der einschlägigen Rechtsvorschriften und Politiken der Union zu katalysieren, indem die Ergebnisse repliziert, die **entsprechenden Ziele in andere Politiken** und in die Praktiken des öffentlichen und privaten Sektors **integriert, Investitionen mobilisiert und der Zugang zu Finanzmitteln verbessert werden.**



Standardaktionsprojekte (SAPs)

Vorläufiges Budget: Natur+Biodiversität 158,5 M€, CCM+CCA 62 M€

Kofinanzierungssatz

- 75 % für Projekte, die ausschließlich prioritäre Lebensräume und/oder Arten betreffen
- 67 % für Projekte, die sowohl prioritäre als auch nicht prioritäre Lebensräume und/oder Arten betreffen
- 60% alle anderen Projekte

Maximale Laufzeit von 10 Jahren

Bewährte Verfahren, Demonstration, Innovation...

➤ Projekte, die sich auf bewährte Praktiken konzentrieren, sind durchaus förderfähig.

Förderfähig und geeignet für die Umsetzung der "Pledges" (MS Zusagen)



European
Commission





Standardaktionsprojekte (SAPs)

Zwei Bereiche der Intervention:

- "Raum für Natur"
- "Die Erhaltung unserer Arten"

Rechtsvorschriften und politische Prioritäten im Bereich Natur und biologische Vielfalt:

- Unterstützung bei der Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften: EU-Vogelschutz- und Habitat-Richtlinien (einschließlich Natura 2000) und die IAS-Verordnung
- Unterstützung der Ziele der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030: Transeuropäisches Naturnetz und EU-Wiederherstellungsplan

Jeder Vorschlag, der in mindestens einen der beiden Interventionsbereiche UND in mindestens eine der beiden politischen Prioritäten fällt, könnte über ein Standardaktionsprojekt im Rahmen von LIFE Natur und biologische Vielfalt finanziert werden



Strategische Naturprojekte (SNaPs) vorläufige Mittelzuweisung 70 Mio.€ Strategische Integrierte Projekte (SIPs), vorläufige Mittelzuweisung 30 Mio.€

SNaPs:

LIFE Natur und biologische Vielfalt

SIPs:

LIFE Kreislaufwirtschaft und Lebensqualität

LIFE Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel

Zweistufiges Antragsverfahren



Strategische Naturprojekte (SNaPs)



- Der Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung von
 - die prioritären Aktionsrahmen (PAFs) im Rahmen der Habitat-Richtlinie,
 - **andere Pläne oder Strategien** zur Umsetzung der EU-Naturschutz- und/oder Biodiversitätspolitik oder des EU-Rechts auf internationaler, nationaler, regionaler oder multiregionaler Ebene
 - **förderungswürdig und geeignet für die Umsetzung der Zusagen (pledges)**
- Erforderlich sind integrierte Ansätze und die Mobilisierung zusätzlicher Mittel
- die Einbeziehung der Ziele der biologischen Vielfalt in andere Politiken und Instrumente fordern
- Kofinanzierungssatz von maximal 60%, max. 14 Jahre Laufzeit

Strategische Naturprojekte (SNaPs) zu berücksichtigende Schlüsselthemen



Priorisierte Aktionsrahmen (**PAFs**) im Rahmen der Habitat-Richtlinie

Andere Pläne oder Strategien, die auf internationaler, nationaler, multiregionaler oder regionaler Ebene von den Behörden angenommen wurden und die EU-Politik oder -Rechtsvorschriften im Bereich Natur und/oder biologische Vielfalt umsetzen, z. B:

- EU-Biodiversitätsstrategie 2030
- EU-Forststrategie 2030
- EU-Initiative für Bestäuber
- Gesetz zur Wiederherstellung der Natur
- EU-Strategie für grüne Infrastruktur
- EU-Verordnung über invasive gebietsfremde Arten



Strategische Naturprojekte (SNaPs) *zu berücksichtigende Schlüsselthemen*



Die für Natur und biologische Vielfalt zuständigen nationalen (regionalen) Behörden, die für die Durchführung der PAF verantwortlich sind, beteiligen sich an den SNaP-Vorschlägen, entweder als Antragsteller (koordinierender Begünstigter) oder, in ordnungsgemäß begründeten Fällen, als assoziierte Begünstigte.

Um eine größtmögliche **geografische Abdeckung der SNAPs** bis 2027 zu gewährleisten, werden die regionalen Behörden nachdrücklich aufgefordert, sich bei der Ausarbeitung ihres Vorschlags mit anderen Regionen zusammenzuschließen.

Grenzüberschreitende SNAPs: Eine koordinierte Umsetzung von SNAPs zwischen den Mitgliedstaaten wird dringend empfohlen.



Strategische integrierte Projekte (SIPs)

- Kofinanzierungssatz von maximal 60%
- Höchstdauer von 14 Jahren
- **Kreislaufwirtschaft und Lebensqualität:**
 - Kreislaufwirtschaft: nationale oder regionale Aktionspläne, Strategien, Fahrpläne oder Ähnliches für die Kreislaufwirtschaft
 - Abfall: nationale und regionale Abfallwirtschaftspläne und/oder Abfallvermeidungsprogramme
 - **Wasser: Bewirtschaftungspläne für Flusseinzugsgebiete, Pläne für das Hochwasserrisikomanagement, Meeresstrategien**
 - Luft: Luftqualitätspläne gemäß der Richtlinie über die Luftqualität, nationale Programme zur Luftreinhaltung
- **Abschwächung des Klimawandels und Anpassung an den Klimawandel:**
 - Nationale Energie- und Klimapläne;
 - Nationale Aktionspläne für die Energieeffizienz;
 - **Nationale oder regionale Anpassungsstrategien oder Aktionspläne;**
 - Städtische oder gemeindebasierte Aktionspläne, die den Übergang zu einer klimaneutralen und/oder klimaresistenten Gesellschaft vorantreiben;
 - **Nationale, regionale** oder branchen-/sektorspezifische **Strategien zur Eindämmung von Treibhausgasen** oder Wirtschaftspläne, die zur Klimaneutralität beitragen

Projekte der technischen Hilfe (TA-R)

Welche Teilprogramme?

- **LIFE Natur und biologische Vielfalt**
- LIFE Kreislaufwirtschaft und Lebensqualität


Einstufig

Worum geht es hier?

Vorbereitung auf die Erleichterung der **breiten Anwendung und Nachahmung** von Ergebnissen aus anderen Projekten, die durch das LIFE-Programm, seine Vorläuferprogramme oder andere EU-Finanzierungsprogramme finanziert wurden.



Typischer Projektablauf

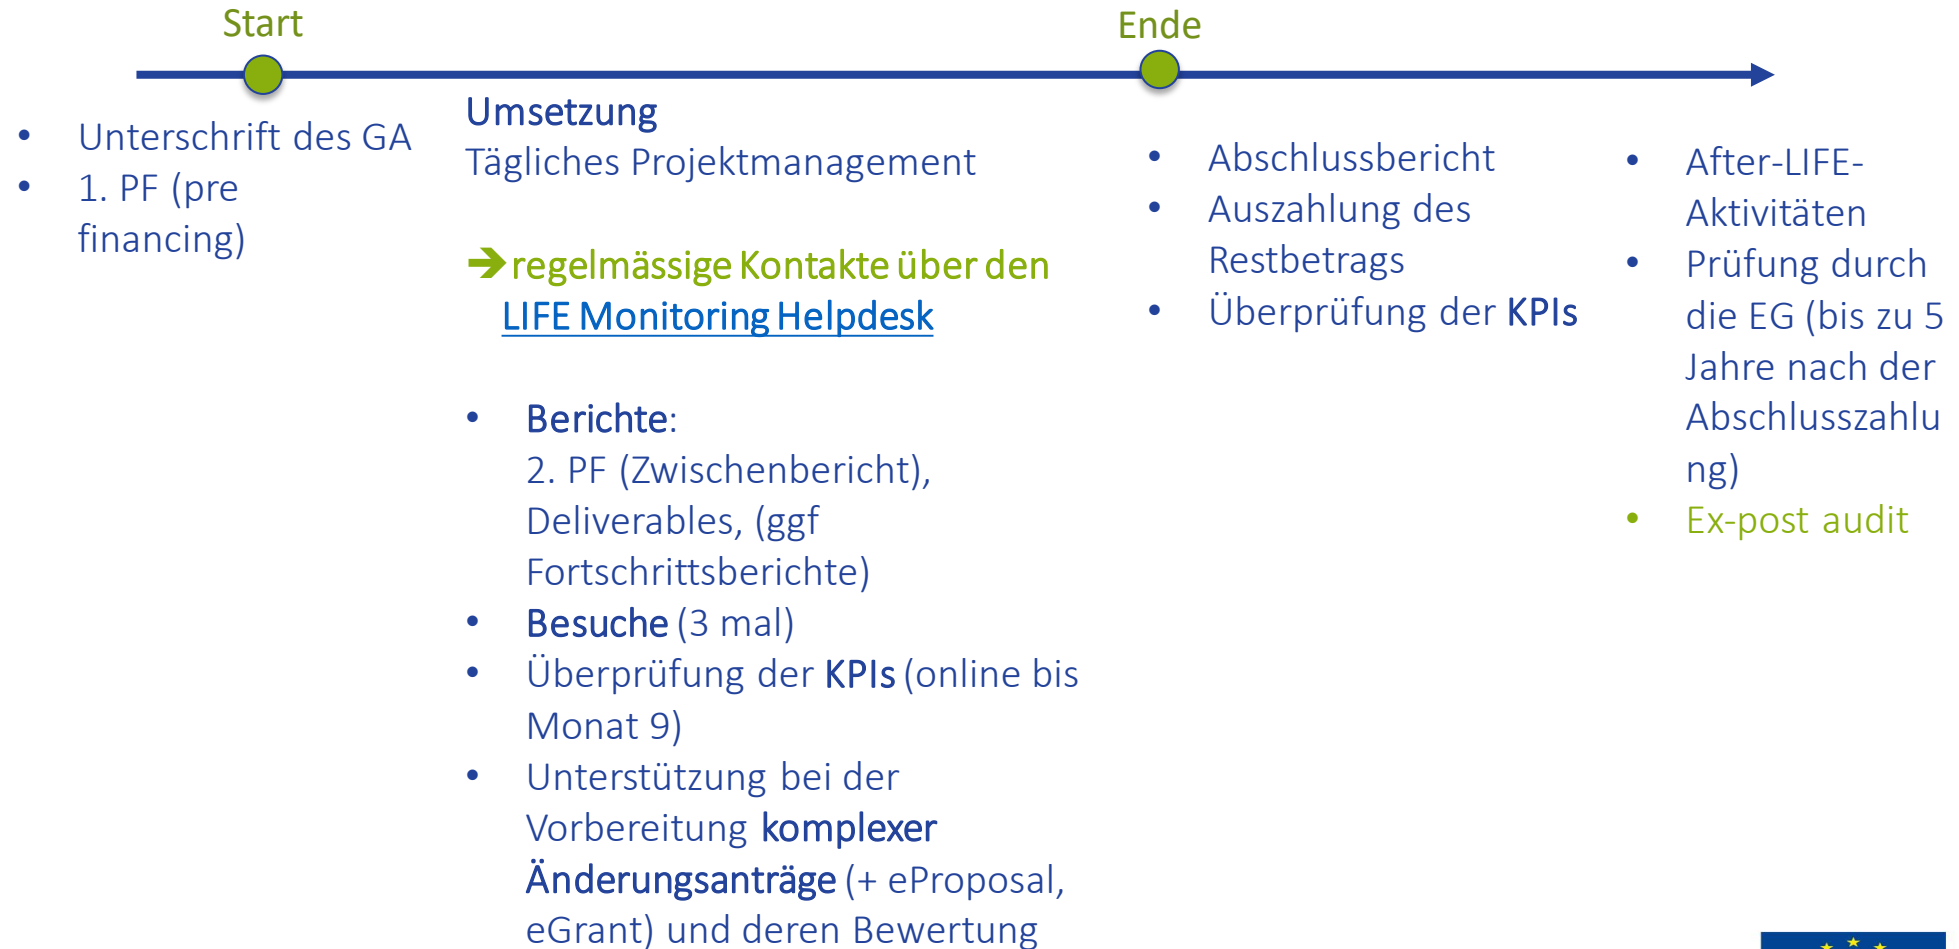

LIFE 2014 – 2020

vs

LIFE 2021 - 2027

LIFE2014 – 2020

1. Keine zeitliche Begrenzung Projektlaufzeit
2. Kommunikation mit CINEA per eMail
3. Berichte / Deliverables in **Butler DB**
4. Zeiterfassung **tagesgenau**
5. Arbeitszeit: Berechnung Personalkosten jährliche produktive Arbeitsstunden
6. '2% Regelung' für festangestellte öffentliche Mittelempfänger
7. **Ausschreibung** private Mittelempfänger verpflichtend (130 T€ LIFE14-16, 135 T€ LIFE17-18, 139 T€ LIFE19-20)
8. Abschreibung für Gebrauchsgüter (Ausnahme LIFE2020)

LIFE2021 - 2027

1. Max 10 Jahre (inkl Verlängerung)
2. **F&T Portal** zentrales Kommunikationstool (Antragstellung, Projektdurchführung, Berichterstellung, Änderungsanträge)
3. **Deliverables** als SEN / PU markiert, keine Änderung möglich, regelmäßiges Hochladen
4. Zeiterfassung **pro Monat**
5. **Arbeitszeit**: 215 Arbeitstage/Jahr **pauschal** (Vollzeit)
6. **Keine '2% Regelung'** mehr für öffentliche Mittelempfänger
7. **Keine Ausschreibung** mehr notwendig (aber Preis-Leistung Verhältnis gegeben)
8. **Keine Abschreibung** mehr (Gebrauchsgüter min 5 Jahre nach Projektende für LIFE Projekt)

Neu: Arbeitszeiten der **Ehrenamtlichen vergütet** (muss im Antrag enthalten sein)



Supported by



Herausforderungen bei der Projektumsetzung

Zu viele Regeln

Partner
springt ab

Budget
reicht nicht

Änderungen zw.
Programm
bis LIFE 2020
ab LIFE21

Verzögerungen

Zu wenig
Flexibilität

Datenschutz,
Schutz geistigen
Eigentums

Zu viele Berichte,
Deliverables,
Milestones,
Arbeitspakete

Projektziele
werden nicht
erreicht



Supported by



Projektmanagement



Effizientes Projektmanagement	<ul style="list-style-type: none">➤ kontinuierlich
	<ul style="list-style-type: none">➤ möglichst keine Wechsel (möglichst Back-up Person integrieren)
	<ul style="list-style-type: none">➤ keine Doppelstrukturen (schwierig: Projektmanager gleichzeitig Abteilungsleiter / CEO)
	<ul style="list-style-type: none">➤ detaillierter Zeitplan erstellen, regelmäßig aktualisieren (Arbeitspakete, deliverables, Berichte, Zuständigkeiten)
	<ul style="list-style-type: none">➤ Ressourcen einplanen (Administration, Finanzen)
	<ul style="list-style-type: none">➤ Tochtergesellschaften (Affiliates) müssen im GA aufgenommen sein, ggf. Änderungsantrag
Komplexe Partnerstruktur	<ul style="list-style-type: none">➤ mehr Zeit einplanen (v.a. grenzüberschreitende Projekte!)
	<ul style="list-style-type: none">➤ bei Partnerwechsel → Änderungsantrag



Projektadministration / Finanzen

Typische Fehler	Lösungen
Zeitplan für vorbereitende Maßnahmen (work package 1) oft zu knapp	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zeitplan anpassen, ➤ prüfen, ob Gesamtzeitplan gefährdet
Personalkosten unrealistisch (z.B. Projekt- und Finanzmanagement nicht ausreichend kalkuliert)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Finanztabellen regelmäßig aktualisieren
Ausschreibungen nicht durchgeführt (private Mittelempfänger)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Achtung, Kosten werden ggf nicht gefördert
Kosten für Audit nicht berücksichtigt ('Certificate of Financial Statement')	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prüfen ob Audit notwendig (EU-Anteil pro beneficiary LIFE14-17: 300T€, LIFE18-20: 325T€, LIFE21 ff: 500T€) ➤ Audit erst beim Endbericht
kein Budgetpuffer mehr für Laufzeitverlängerung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erhöhung Eigenanteil/Kofinanzierung ➤ Umwidmung Budget
Kostenerhöhungen nicht ausreichend kalkuliert (externe Subunternehmer, Material)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erhöhung Eigenanteil/Kofinanzierung ➤ Umwidmung Budget



Supported by



Projektziele werden nicht erreicht

Mögliche Gründe	Lösungen
Projektverzögerung	➤ Verlängerung beantragen
Technische Änderungen in den Arbeitspaketen: (1) Bei geringfügigen Änderungen (2) Bei komplexen Änderungen (3) Bei Änderungen, die die Erreichung der Projektziele gefährden	Monitoring Team informieren (1) Im nächsten Bericht dokumentieren (2) Änderungsantrag stellen (3) u.U. Projektabbruch
Budget reicht nicht aus	Erhöhung des Eigenanteils / Kofinanzierung
Genehmigungen dauern länger	➤ Absprachen mit Behörden während der Antragstellung soweit möglich bzw zu Projektbeginn.

Zeitnah Monitoring Team informieren !!



Deliverables / Milestones

Potenzielle Probleme	Lösungen
Oft zu viele Deliverables / Milestones	➤ Müssten trotzdem erstellt werden, ggf Zusammenlegung mehrerer Deliverables zu einem Bericht
Zeitplan unrealistisch / verspätete Abgabe	➤ Anpassungen oft möglich auch ohne Änderungsantrag
Deliverables unrealistisch / nicht sinnvoll (oft der Fall, wenn externe Berater in Antrag eingebunden waren)	➤ Müssten i.d.R. erstellt werden, ggf Änderungsantrag stellen
Partner reichen Deliverables nicht zeitnah ein	➤ Koordinierender Mittelempfänger ist verantwortlich, ggf Zeitplan anpassen
Verspätete Abgabe der Deliverables	➤ Müssen spätestens mit den Berichten (Zwischen-/Endbericht) erstellt sein ➤ Dem Monitoring Team vor dem Besuch schicken

Achtung: Deliverables in nationaler Sprache, jedoch Zusammenfassung in Englisch



Praktische Hinweise

Bei Unternehmen mit verzweigten Niederlassungen unbedingt prüfen, ob diese als **affiliates** aufgenommen werden müssen

Ab LIFE21 ff:

- Sorgfältige Berechnung **Personalkosten** vornehmen!
Eine volle Stelle wird mit 215 AT/Jahr berechnet (8h/d)
- Änderungsantrag notwendig, wenn eine Position bei Drittleistung (subcontracting) hinzukommt,
max. Höhe Drittleistung 30% der förderfähigen Kosten!
- Begriffe beachten:
 - beneficiary, associated partner
 - Projekt = Action



Herausforderungen Antragstellung



- Es gibt einen **starken Wettbewerb** um LIFE-Mittel
- Neue **IT-Umgebung** und **Anwendungsformulare**
- Vorschläge, die **scheitern**, sind entweder **schlecht vorbereitet** oder einfach nur **wenig ehrgeizig** oder **risikobereit**.

Nützliche Links und Dokumentation

Wo findet man Anleitungen, Vorlagen, ...etc.

- **LIFE-Website** → https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en
- **Portal Funding & Tender (F&T)** → <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home>
(Koordinierender Begünstigter)


The top screenshot shows the 'Guidance & Manuals' section of the portal. A blue box highlights the 'Reference documents' link, which is described as 'The page reference documents of the programmes managed on the EU Funding & Tenders Portal including legal documents, work programmes, model grant agreements and guides for specific actions.' An arrow points from this box to the bottom screenshot.

The bottom screenshot shows the 'Reference Documents' page. It features a 'Programming period' dropdown set to '2021-2027' and a 'Programme for the Environment and Climate Action (LIFE)' filter. The page lists two main categories: 'Grants' and 'Procurement'. Under 'Grants', it states: 'This page includes reference documents of the programmes managed on the EU Funding & Tenders portal starting with legal documents and the Commission work programmes up to model grant agreements and guides for specific actions. Please select the programme to see the reference documents.' Under 'Procurement', it states: 'Reference Documents related to tendering opportunities are published on TED eTendering in the calls for tenders.' A search filter and an 'Expand all' button are also visible.

+ Verwaltung von Projektleistungen, Meilensteinen, Kontakten mit CINEA...usw.



Wie funktioniert das **Funding & Tender Portal** ?



The screenshot shows the 'EU Login' interface. At the top left, it says 'EU Login' and 'One account, many EU services'. At the top right, there is a language selector set to 'English (en)'. The main heading is 'Sign in to continue'. Below this is a white box containing a form. The form has a label 'Enter your e-mail address or unique identifier' above a text input field. To the left of the input field is a link 'Create an account'. To the right is a blue button labeled 'Next >'. Below the input field, there is a horizontal line with 'Or' in the center. Underneath are four social media login options, each with a small icon and a link: 'Sign in with your eID' (globe icon), 'Sign in with Facebook' (Facebook 'f' icon), 'Sign in with Twitter' (Twitter bird icon), and 'Sign in with Google' (Google 'G' icon).

<https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?>



Funding & Tender Portal

The screenshot shows the 'Funding & tender opportunities' page on the European Commission's SEDIA portal. The URL is ec.europa.eu/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search:callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA:freeTextSearchKeyword=:matchWholeText=true:typeCodes=0,1,2,8:statusCodes=31094501,31094502,31094503:programmePeriod=nu.... The page title is 'Funding & tender opportunities' and the subtitle is 'Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA)'. The language is set to English. The main navigation bar includes 'SEARCH FUNDING & TENDERS', 'HOW TO PARTICIPATE', 'PROJECTS & RESULTS', 'WORK AS AN EXPERT', and 'SUPPORT'. The current filter is 'Programme for the Environment and Climate Action (LIFE)'. The search filters on the left include a search bar, 'Match whole words only' (checked), 'GRANTS' (checked), and 'TENDERS' (checked). The 'Submission status' filter shows 'Forthcoming', 'Open for submission', and 'Closed (3)'. The 'Programming period' filter is set to 'Programme for the Environment and Climate Action (LIFE)'. The 'Filter by call' filter is set to 'LIFE-2021-SAP-CLIMA (3)'. The 'Type of grants calls' filter is empty. The main content area shows 'Funding and tenders (3)'. The first entry is 'Climate Change Mitigation' (LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM) with a status of 'Closed'. The second entry is 'Climate Change Adaptation' (LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA) with a status of 'Closed'. The third entry is 'Climate Governance and Information' (LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV) with a status of 'Closed'. Each entry includes details for Programme, Type of action, Opening date, Status, Deadline model, and Deadline date.

Programme	Type of action	Opening date	Status	Deadline model	Deadline date
Programme for Environment and Climate Action (LIFE)	LIFE Project Grants	13 July 2021	Closed	single-stage	30 November 2021 17:00:00 Brussels time
Programme for Environment and Climate Action (LIFE)	LIFE Project Grants	13 July 2021	Closed	single-stage	30 November 2021 17:00:00 Brussels time
Programme for Environment and Climate Action (LIFE)	LIFE Project Grants	13 July 2021	Closed	single-stage	30 November 2021 17:00:00 Brussels time



European Commission

Funding & Tender Portal

The screenshot shows the 'Funding & tender opportunities' page for the 'Programme for the Environment and Climate Action (LIFE)'. The 'SUPPORT' menu is highlighted with a red circle, containing the following items: Support overview, Guidance & Manuals, FAQ, Helpdesk & Support Services, and Support videos. Below the menu, there is a 'Helpdesk & Support Services' section with a notification about COVID-19 measures. On the left, there are filters for 'GRANTS' and 'TENDERS', a 'Programming period' dropdown set to '2021-2027', and a 'Programme for the Environment and Climate Action (LIFE)' tag. On the right, there are three service cards: 'IT Helpdesk', 'Europe Direct', and 'Research Enquiry Service'.

ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks;programCode=LIFE2027

European Commission | Funding & tender opportunities | Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA) | Engl | Register

SEARCH FUNDING & TENDERS | HOW TO PARTICIPATE | PROJECTS & RESULTS | WORK AS AN EXPERT | **SUPPORT**

Support overview
Guidance & Manuals
FAQ
Helpdesk & Support Services
Support videos

Programme for the Environment and Climate Action (LIFE)

Helpdesk & Support Services

Please note that due to the measures related to the COVID-19 outbreak our IT Helpdesk works in non-standard remote operation, which could introduce some handling delays.

GRANTS TENDERS

Programming period
2021-2027

Programme for the Environment and Climate Action (LIFE)

Support overview
Guidance & Manuals
FAQs

IT Helpdesk
The IT Helpdesk answers your questions about the Funding & Tenders Portal tools and processes.

Europe Direct
Questions about the EU? Europe Direct can help.

Research Enquiry Service
The service deals with enquiries about the validation process of legal entities for all the EU programmes. However, you are requested to contact the Validation Services via the Participant Register first. If you do not have access to the Participant Register, you can submit here your enquiry.



European Commission

Kommunikation, Sichtbarkeit & Vernetzung

- **Kommunikations- und Verbreitungs- (Dissemination-) plan** (Deliverable) mit Zielen, Schlüsselbotschaften, Zielgruppen, Kommunikationskanälen, Plan für soziale Medien, Budget und Indikatoren für Monitoring und Evaluierung.
- Jegliche **Kommunikation/Publikation** im Zusammenhang mit dem Projekt sollte **das LIFE-Logo + Erklärung tragen** (weitere Informationen https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/communication-and-gdpr-rules_en)
- Audiovisuelle Medien – Pflichttext für **Abspann!**
- **Projektwebseite** online und regelmäßig aktualisiert
- **Info-Tafeln** an strategischen Orten
- **Bericht des Laien** und **Plan für die Zeit nach dem Tod** (Ergebnisse)
- **Hochladen öffentlicher Projektergebnisse auf die Plattform für LIFE-Projektergebnisse (F&T-Portal).**
- CINEA/ Referat Politik zu Veranstaltungen einladen



Supported by



Kommunikation und Vernetzung

- **LIFE-Networking** wird dringend empfohlen bzw. notwendig!
- Netzwerk mit erfahrenen Projekten
- Teilnahme an Plattform- und Netzwerktreffen
- Das Monitoring-Team kann Sie dabei unterstützen, ähnliche LIFE-Projekte zu überprüfen (über den LIFE-Helpdesk oder bei Besuchen)



Kommunikation und Vernetzung

Was sind Ihre Praktiken?

Kommunikationsmanagement

- ? • Kommunikationsmanager ?

Webseite

- ? • Online?
- ? • Regelmäßig aktualisiert → Rubrik "News und Updates" ?
- Leicht zugänglich
- **/!\ Bleibt nach Abschluss des Projekts 5 Jahre lang online**

? Andere Kommunikationsmaterialien

- Soziale Medien ? Veröffentlichungen ? Videos ?

? Teilnahme an thematischen/vernetzenden Veranstaltungen

- Projekteinführung ? Konferenzen ? Arbeitsgruppen ?



Danke
und viel LIFE Erfolg!



https://cinea.ec.europa.eu/life_en



[LIFE-Programm](#)



[@LIFEprogramme](#)
[@CleanEnergy_EU](#)



[LIFE-Programm](#)



[LIFE-Programm](#)



[@LIFEprogramme](#)



[LIFE-Newsletter](#)
[Newsletter für saubere Energie](#)



European
Commission
